


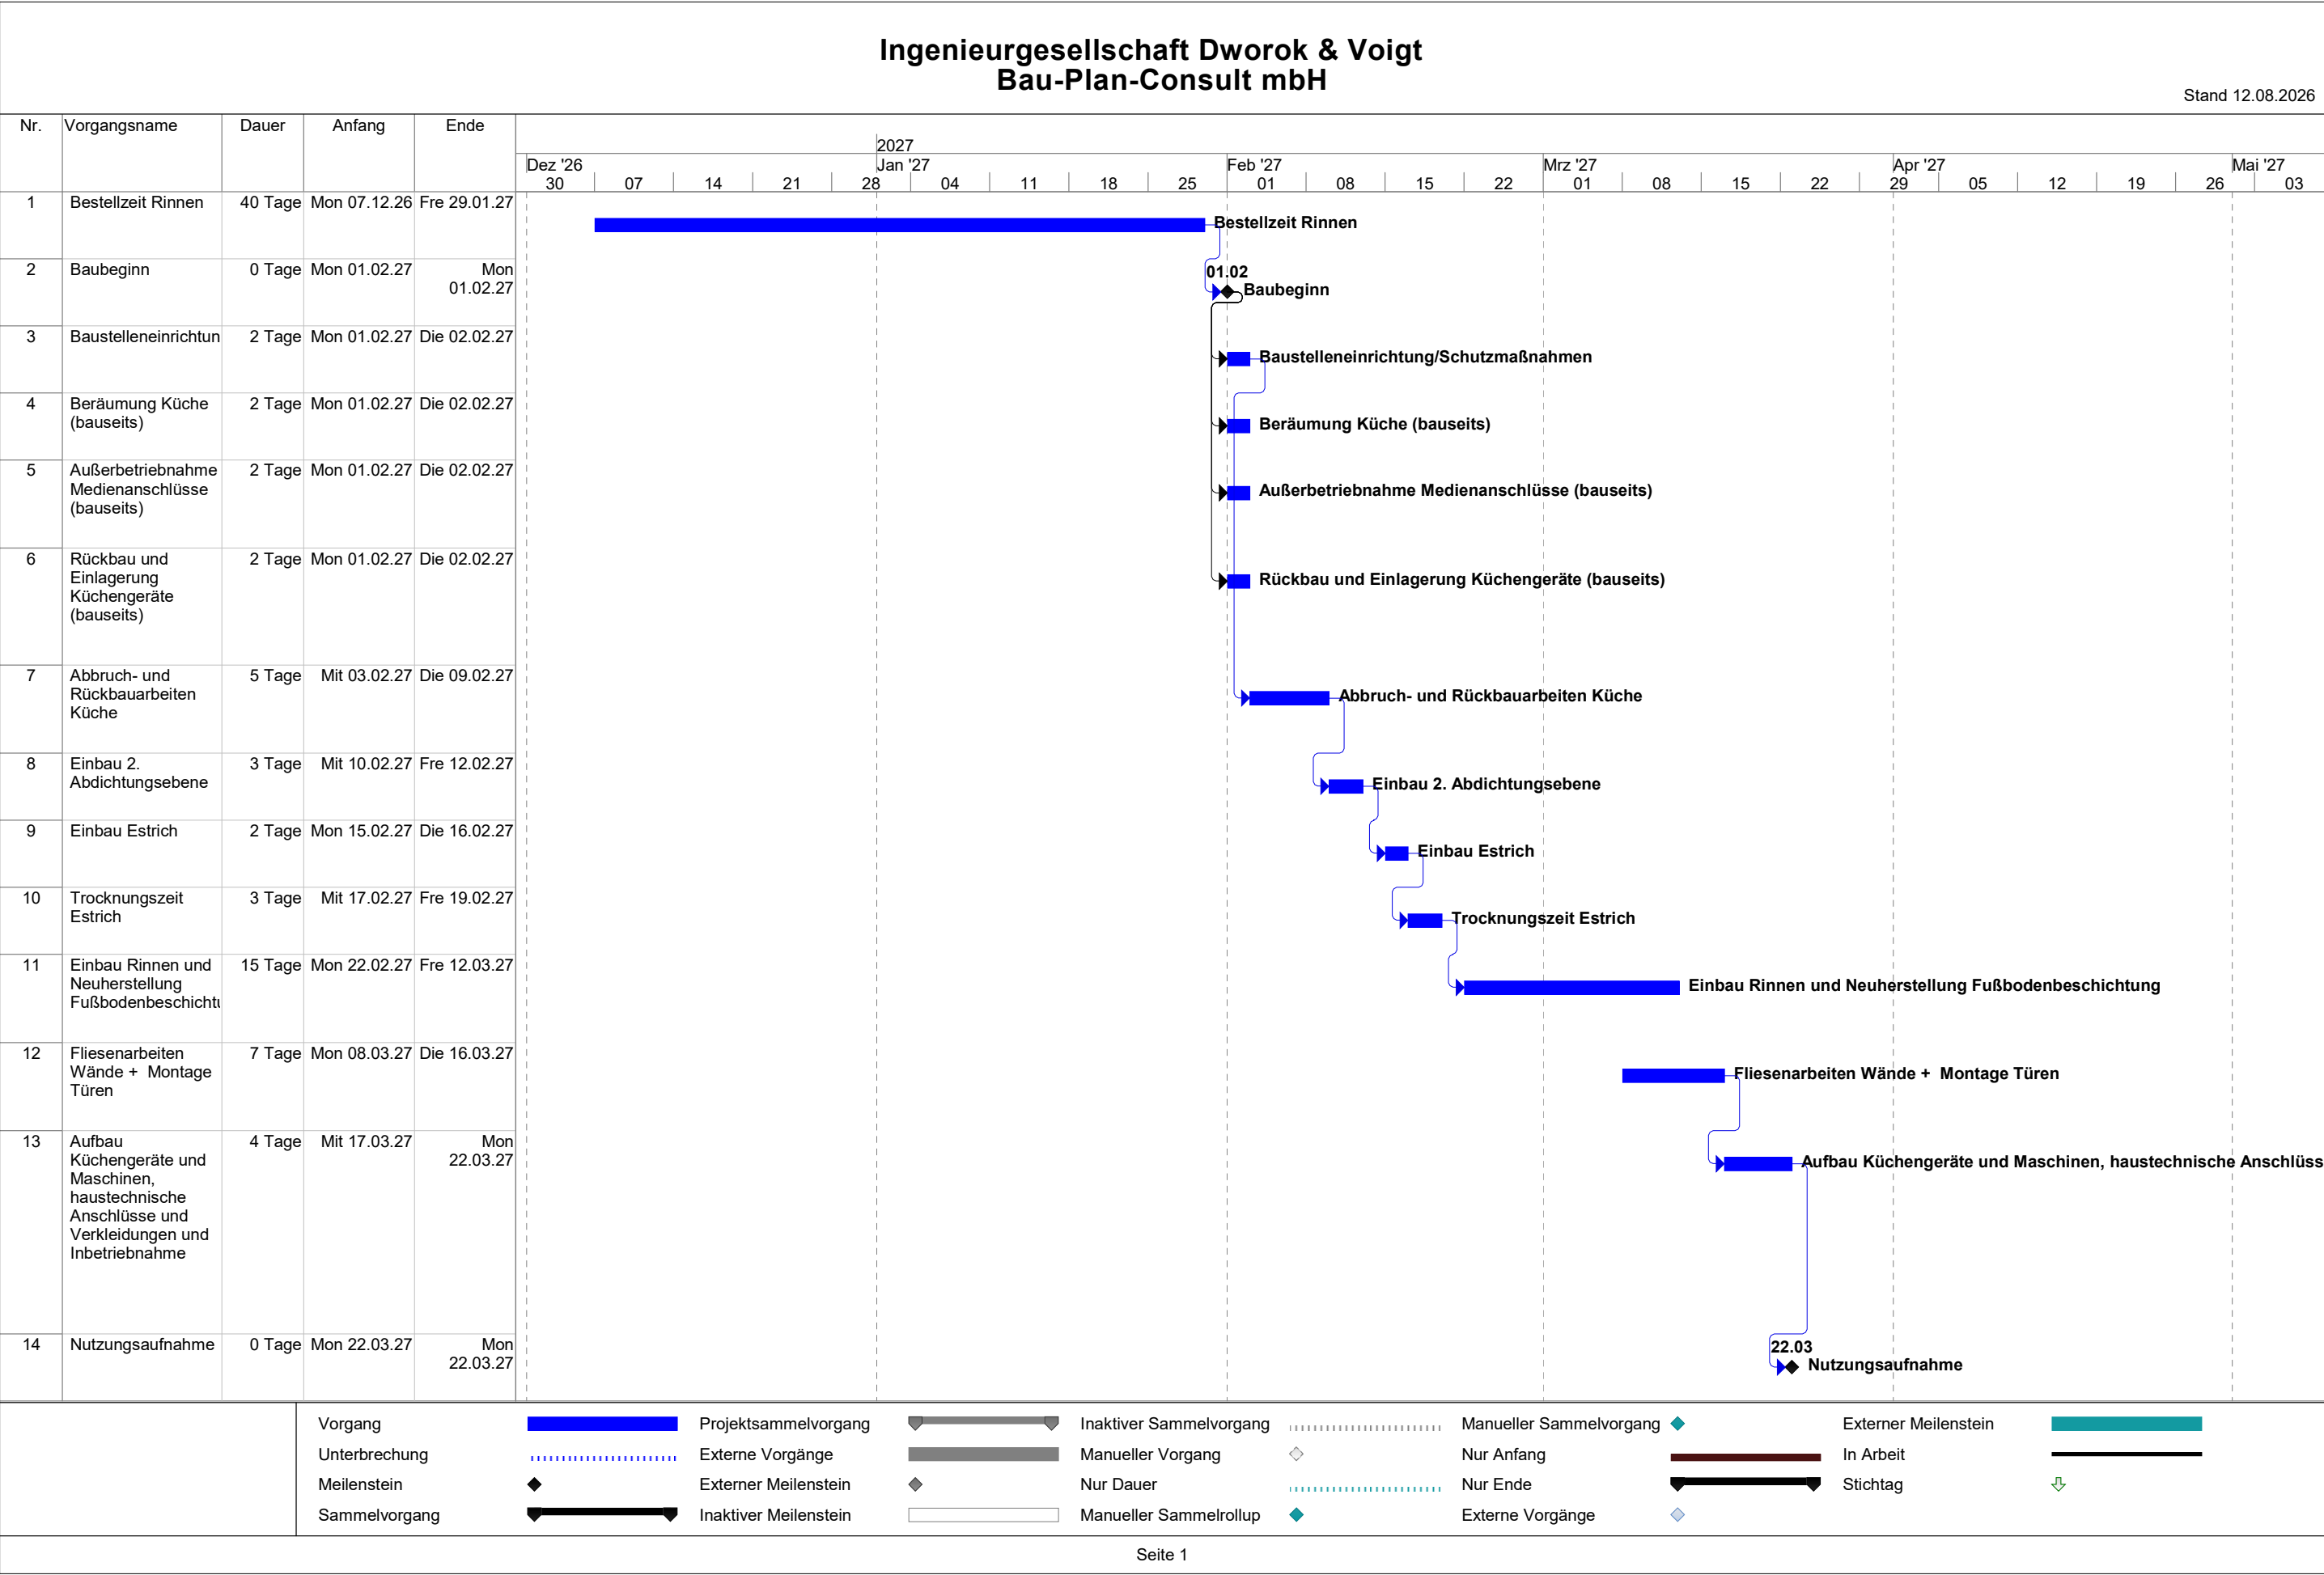

Ingenieurgesellschaft Dworok & Voigt
Bau-Plan-Consult mbH

Stand 12.08.2026

Stand 12.08.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																																	
					Mai '27							Jun '27							Jul '27							Aug '27							Sep '27				
					03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04										
1	Bestellzeit Rinnen	40 Tage	Mon 07.12.26	Fre 29.01.27																																	
2	Baubeginn	0 Tage	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27																																	
3	Baustelleneinrichtun	2 Tage	Mon 01.02.27	Die 02.02.27																																	
4	Beräumung Küche (bauseits)	2 Tage	Mon 01.02.27	Die 02.02.27																																	
5	Außerbetriebnahme Medienanschlüsse (bauseits)	2 Tage	Mon 01.02.27	Die 02.02.27																																	
6	Rückbau und Einlagerung Küchengeräte (bauseits)	2 Tage	Mon 01.02.27	Die 02.02.27																																	
7	Abbruch- und Rückbauarbeiten Küche	5 Tage	Mit 03.02.27	Die 09.02.27																																	
8	Einbau 2. Abdichtungsebene	3 Tage	Mit 10.02.27	Fre 12.02.27																																	
9	Einbau Estrich	2 Tage	Mon 15.02.27	Die 16.02.27																																	
10	Trocknungszeit Estrich	3 Tage	Mit 17.02.27	Fre 19.02.27																																	
11	Einbau Rinnen und Neuherstellung Fußbodenbeschichtu	15 Tage	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27																																	
12	Fliesenarbeiten Wände + Montage Türen	7 Tage	Mon 08.03.27	Die 16.03.27																																	
13	Aufbau Küchengeräte und Maschinen, haustechnische Anschlüsse und Verkleidungen und Inbetriebnahme	4 Tage	Mit 17.03.27	Mon 22.03.27	Anschlüsse und Verkleidungen und Inbetriebnahme																																
14	Nutzungsaufnahme	0 Tage	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27																																	

Vorgang		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
Unterbrechung		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
Meilenstein		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Nur Ende		Stichtag	
Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge			
