
Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**BIZ Erweiterung**	**1444 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Mit 23.04.31**
2		VO-Beschluss liegt vor	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25
3		**WBW - Durchführung**	**211 Tage**	**Die 10.02.26**	**Mon 07.12.26**
50		**Beschaffung weitere Planer**	**426 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 17.03.28**
51		Markterkundungen	1,5 Monate	Mon 27.07.26	Fre 04.09.26
52		Beschaffung / Verhandlung Architekt	4,85 Monate	Mon 14.09.26	Fre 29.01.27
53		Beschaffung Baugrundgutachten	4,6 Monate	Mon 21.09.26	Fre 29.01.27
54		Beschaffung Landschaft-/ Verkehrssplaner	5,1 Monate	Mon 07.09.26	Fre 29.01.27
55		Beschaffung Brandschutzplaner	5,1 Monate	Mon 07.09.26	Fre 29.01.27
56		Beschaffung TGA Planer	5,63 Monate	Mon 07.09.26	Mon 15.02.27
57		Beschaffung Tragwerksplaner	5,63 Monate	Mon 07.09.26	Mon 15.02.27
58		Beschaffung Medientechnik und Akustik	2,5 Monate	Mon 18.01.27	Fre 26.03.27
59		Beschaffung Küchenplaner	1,5 Monate	Mon 18.01.27	Fre 26.02.27
60		Beschaffung Kompensationsgutachten	1,1 Monate	Mon 11.10.27	Die 09.11.27
61		Einarbeitung / Onboarding Planer	1,88 Wochen	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27
62		Beschaffung Beweissicherung Bestand	2,25 Monate	Mon 17.01.28	Fre 17.03.28
63		**Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfspl.**	**160 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Fre 08.10.27**
64		Kick Off	0 Tage	Mon 01.03.27	Mon 01.03.27
65		LPH 01 Grundlagenermittlung	1 Monat	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27
66		LPH 02 Vorentwurfsplanung	2 Monate	Mon 29.03.27	Fre 21.05.27
67		Freigabe LPH 02	2 Wochen	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27
68		LPH 03 Entwurfsplanung	2,5 Monate	Mon 07.06.27	Fre 13.08.27
69		Prüfung Planung durch PS	1,3 Wochen	Mon 16.08.27	Die 24.08.27
70		Überabreitung	1,7 Wochen	Die 24.08.27	Fre 03.09.27
71		8.09.2027 Unterlagen an Vorstand	0 Tage	Mit 08.09.27	Mit 08.09.27
72		Freigabe Vorstand und V_Rat	4,8 Wochen	Die 07.09.27	Fre 08.10.27
73		**BAS & Genehmigungsplanung**	**199 Tage**	**Mon 13.09.27**	**Mon 19.06.28**
74		Erstellung Unterlagen BAS	1 Monat	Mon 13.09.27	Fre 08.10.27
75		Dauer BAS Genehmigung	5,1 Monate	Mon 11.10.27	Mit 01.03.28
76		Genehmigungsplanung	2 Monate	Mon 31.01.28	Fre 24.03.28
77		Genehmigungsphase	3 Monate	Mon 27.03.28	Mon 19.06.28
78		**Ausführungspl. + Beschaffung-Neubauten**	**269 Tage**	**Die 23.05.28**	**Fre 08.06.29**
79		Ausführungsplanung	6 Monate	Die 23.05.28	Die 07.11.28
80		LV-Erstellung	3 Monate	Die 26.09.28	Die 19.12.28
81		Beschaffung Baumfällungen	1,5 Monate	Mit 22.11.28	Fre 05.01.29
82		Beschaffungsphase Bauleistungen	5,95 Monate	Mit 20.12.28	Fre 08.06.29
83		**Umsetzung Neubauten +Eröffnung**	**506 Tage**	**Mon 08.01.29**	**Die 31.12.30**
84		Rodungen / Baufeld (Okt. Bis Ende Feb.)	7 Wochen	Mon 08.01.29	Fre 23.02.29
85		Rüstzeit	4 Wochen	Mon 11.06.29	Fre 06.07.29
86		Bemusterungen	9 Wochen	Mon 09.07.29	Fre 07.09.29
87		Baubebginn / Baustelleneinrichtung	6 Wochen	Mon 09.07.29	Fre 17.08.29
88		Bauzeit	17,35 Monate	Mon 20.08.29	Die 31.12.30
89		voraussichtliche Eröffnung	0 Monate	Die 31.12.30	Die 31.12.30
90		Umschluss-Wasser/ Brunnen	5,05 Monate	Mon 15.10.29	Fre 08.03.30
91		Nachlauf und Mängelbeseitigungen	4 Monate	Don 02.01.31	Mit 23.04.31

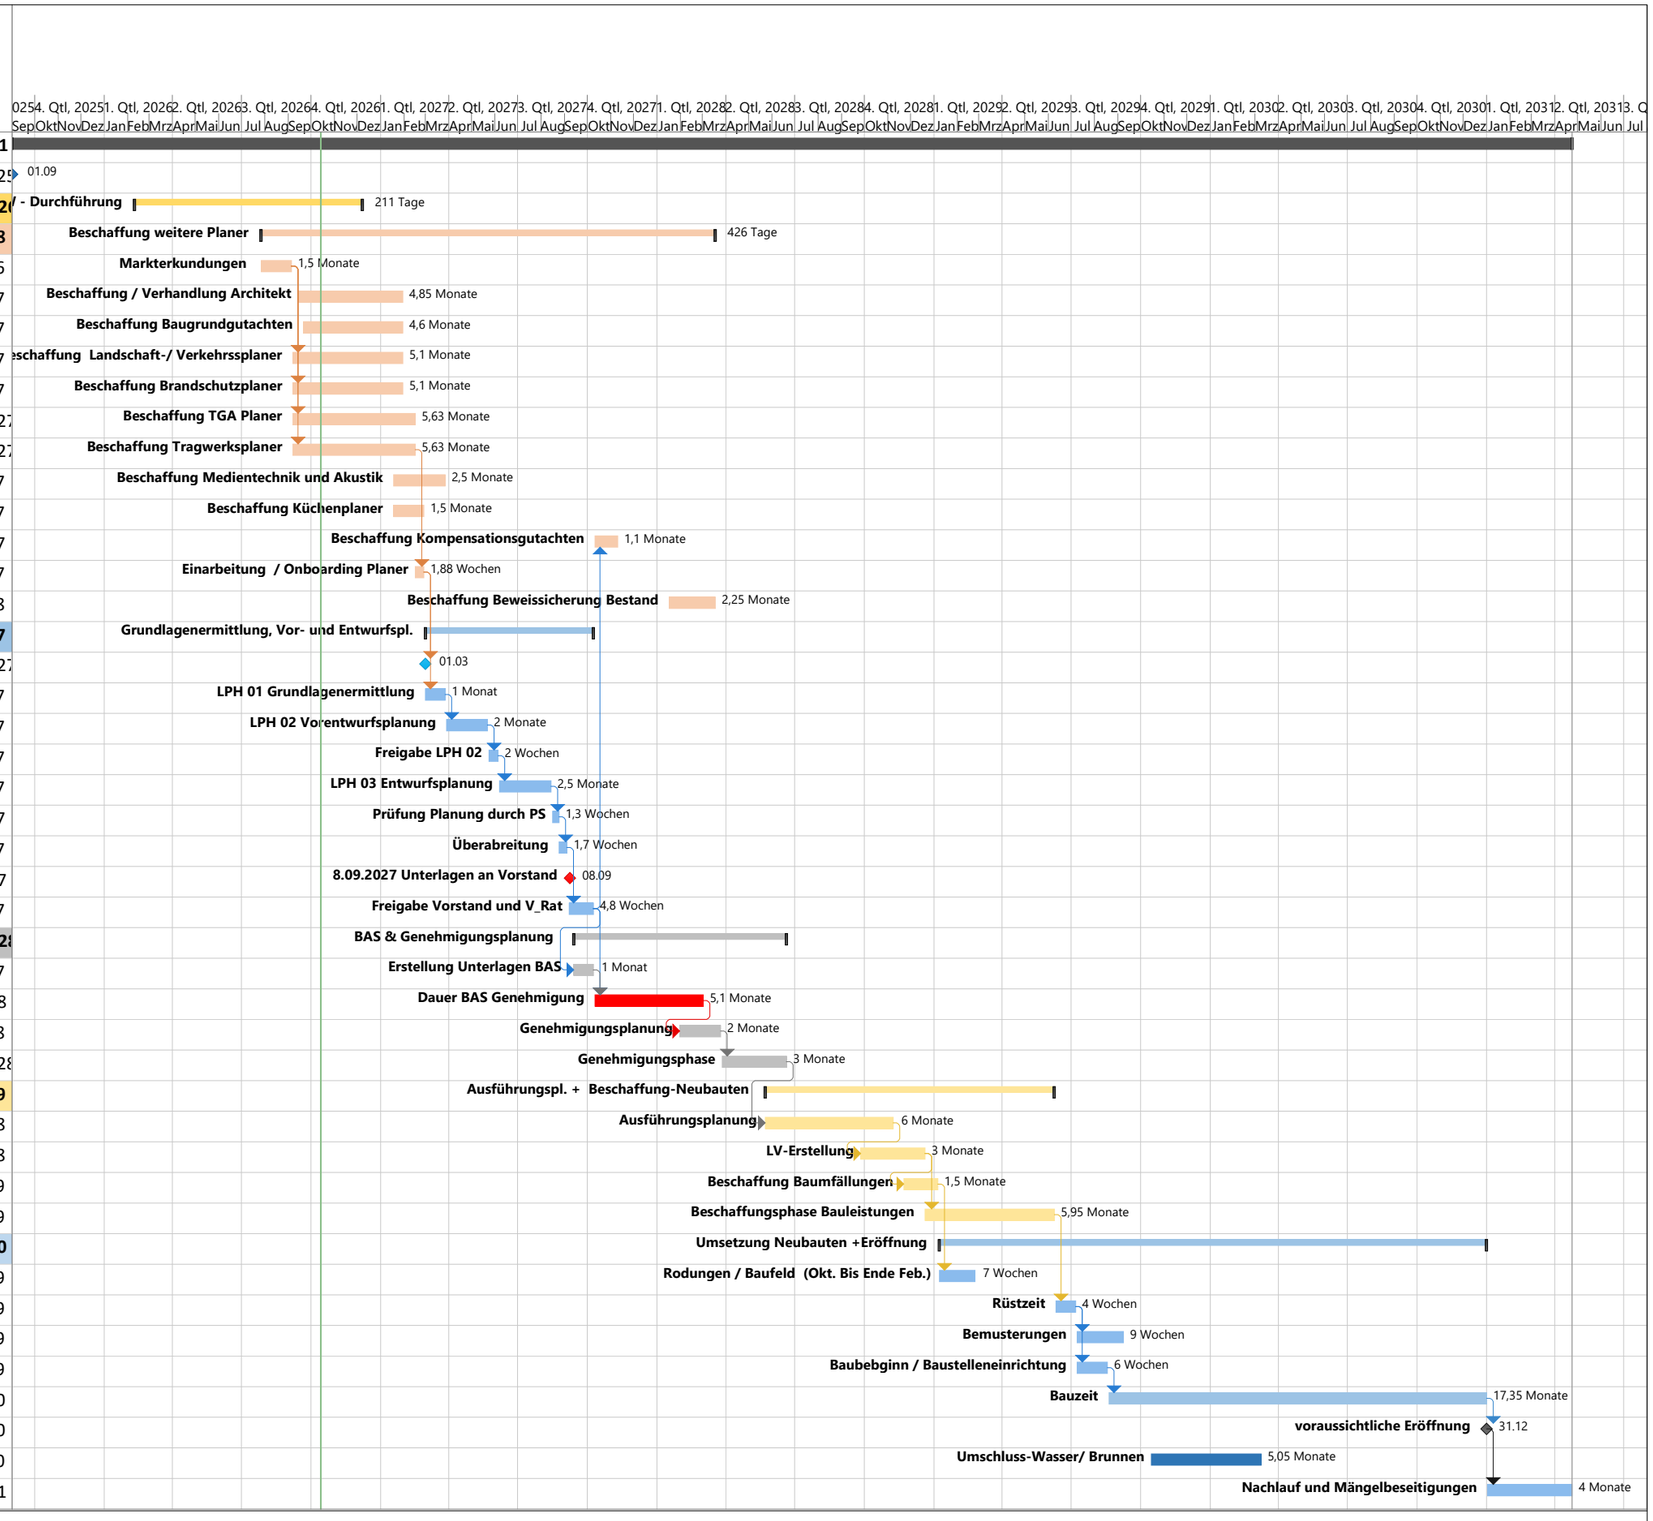

Erweiterung BIZ Salzhausen
Entwurf - Rahmenterminplan

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein
